

TERMO DE REFERÊNCIA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA E PICADEIRO PARA ARENA DA FABRICA DE CULTURA DE VILA NOVA CACHOEIRINHA

1. OBJETO

Fabricação e Instalação de estruturas de Arquibancada, Palco e Picadeiro para a Arena/Lona de circo da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1 Fabricação e montagem de arquibancada modular com capacidade mínima de 200 lugares, modelo HMMH, para ser montada e utilizada de várias formas em espaço de circo 14mX32m.

2.2 Palco modular 8mX8m por 1m de altura, que pode ser montado nos formatos 8mX8m ou em dois palcos 4mX4m.

2.3. Picadeiro com 6mts de diâmetros por 70cm de altura.

2.4 Estrutura metálica treliçada de 10m de comprimento com 6m de altura para sustentação de cortinas e luz de espetáculo.

2.5. Os memoriais descritivos com as especificações técnicas das estruturas acima descritas encontram-se no **Anexo Técnico** que é parte integrante deste termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

A presente estrutura visa dar viabilidade técnica para as atividades do programa FOLIA - FORMAÇÃO LIVRE E DESENVOLVIMENTO DAS ARTES CIRCENSES a ser desenvolvido na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha com atividades de apresentação circense tanto dos aprendizes do programa quanto de grupos externos em itinerância, residência artística e intercâmbio com o programa. A estrutura completa da Arena no formato de circo visa abrigar tanto as apresentações de grupos externos quanto as apresentações dos grupos do programa FOLIA, bom como apresentações de outras linguagens artísticas no escopo do Programa Fábrica Aberta.

4. LOCAL DO SERVIÇO

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Imóvel localizado na rua Franklin do Amaral 1.575, São Paulo - SP

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

Máximo de 90 (noventa dias) corridos a partir da assinatura do contrato.

6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Pagamento será realizado conforme cronograma físico financeiro apresentado juntamente com a proposta, em até 15 (quinze) dias após apresentação da nota fiscal.

POIESIS

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 | www.poiesis.org.br

7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES

A POIESIS disponibilizará energia elétrica e espaço para armazenamento temporário de materiais durante o processo de instalação das estruturas objeto deste termo de referência.

A POIESIS disponibilizará técnico responsável para dirimir dúvidas e acompanhar a instalação das estruturas em conjunto com o fornecedor.

O contratado deverá seguir todas as orientações da POIESIS quanto aos horários de trabalho e regras de funcionamento do espaço bem como observar toda e qualquer legislação concernente à segurança no trabalho aplicável para a execução dos serviços objeto deste termo de referência.

8. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor será habilitado mediante a apresentação da documentação abaixo, juntamente com a proposta comercial:

8.1. Experiência na execução de projetos de complexidade compatível, comprovada em portfólio de projetos realizados na área.

8.2. Indicação de responsável técnico pelos serviços com apresentação de currículo técnico e demonstração de experiência comprovada na fabricação de estruturas metálicas e porte compatível ou superior ao escopo de trabalho definido neste termo de referência.

8.3. Apresentação do CREA do responsável técnico

8.4. Apresentação do Atestado de visita técnica

9. INABILITAÇÃO DO FORNECEDOR

Será inabilitada a empresa que não apresentar a documentação solicitada nos itens 08 e 12 deste Termo de Referência.

10. VISITA TÉCNICA

As visitas técnicas que se façam necessárias aos locais devem ser agendadas por email ou outra forma de comunicação eletrônica com o Gerente da unidade, Sr. Rubens Morais e-mail: rubensmorais@fabricasdecultura.org.br. Caso não seja realizada a visita técnica, a proponente não poderá alegar desconformidade do Termo de Referência.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor valor global

12. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A proposta apresentada será parte integrante de contrato a ser celebrado com a empresa contratada para o serviço.

A proposta deverá conter os seguintes itens:

POIESIS

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 | www.poiesis.org.br

- a) Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, endereço eletrônico, descrição dos serviços, formas e prazos de pagamento.
- b) Apresentação de portfólio de projetos realizados que demonstre experiência profissional, comprovada da empresa e/ou do(s) responsável (is) técnico (s) na execução de serviços similares em termo técnicos aos definidos neste termo de referência.
- c) Indicação de responsável técnico pelos serviços com apresentação de respectivo currículo profissional.
- d) Descritivo do trabalho compatível com o escopo definido no item 2 deste termo de referência.
- e) **PREÇO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS INSTALADOS:** A proposta comercial deverá apresentar o VALOR GLOBAL em Reais dos serviços solicitados conforme escopo especificado no item 2 deste Termo de Referência.
- f) Apresentar cronograma físico financeiro juntamente com a proposta

A PROPONENTE, deverá apresentar juntamente com a proposta comercial, os seguintes documentos:

- Inscrição no CNPJ;
- Inscrição estadual e/ou municipal;
- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso de sociedade civil simples, acompanhada da prova de diretoria em exercício.
- Relação de empresas onde tenha prestado o tipo de serviço semelhante (empresa, contato e telefone);
- Certidão de Débitos Relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união;
- Certidão de regularidade de situação com fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);
- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Comprovante de dados bancários
- Atestado de Capacidade Técnica (mínimo 02)

São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

RENZO DINO SERGENTE ROSSA
DIRETOR DE FABRICAS DE CULTURA

ANEXO TÉCNICO

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA ARQUIBANCADA


1. GENERALIDADES

A presente especificação refere-se à fabricação e montagem de arquibancada modular com capacidade mínima de 200 lugares, modelo HMMH, para ser montada e utilizada de várias formas em espaço de circo 14mX32m.

2. ESPECIFICAÇÕES

2.1. Estruturas metálicas.

O conjunto de arquibancada deverá conter 40 lances ou mais, em formato de escada com 2,00m de altura com seis degraus contendo 0,60m para parte de acentos e passarelas e 0,45m para parte de degraus. Os tramos deverão ser fabricados com metalão de aço 60X60 com espessura de 2,65mm, divididos em 8 tramos. Os tramos serão divididos em 4 partes centrais móveis e 4 cantos, com guarda corpo de estrutura metálica com 1,80m com as medidas necessárias que atendam às normas da ABNT e do corpo de bombeiros. Para obter movimentos e proporcionar várias formas de montagem, cada tramo deverá ter um sistema de 6 rodas ou mais, com rodízios giratórios 360 de PVC para 200k cada. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica através do sistema MIG.

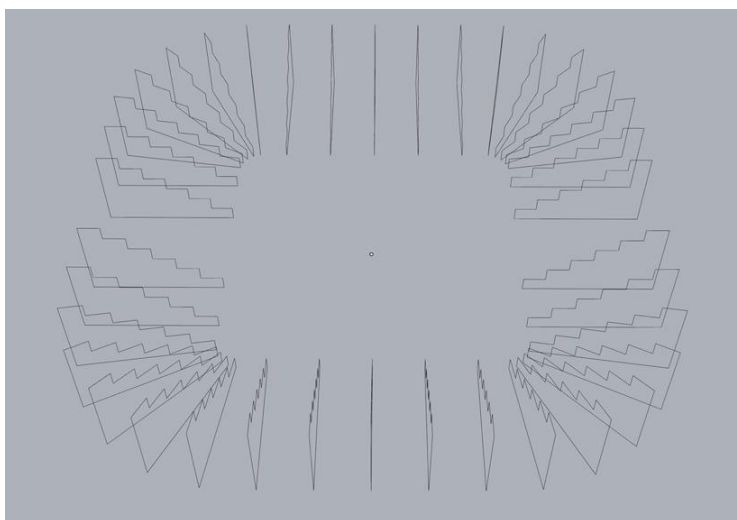

2.2 Revestimento e acentos.


O revestimento da arquibancada deverá ser com chapas de compensado naval marítimo de 20mm ou mais, as chapas deverão ser tratadas com acabamento em verniz marítimo e reforçadas em toda sua borda com metalão em U de 30mmX20mmX30mm com espessura de 1mm, com sistema

POIESIS

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 | www.poiesis.org.br

de travas e encaixes com pinos de vergalhões de aço. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica através do sistema MIG.

Na parte frontal dos assentos deverá ter um acabamento em almofada de espuma de 50mm densidade 33, com suporte de apoio com espuma PAC de 20mm, forrada com acabamento em courvin náutico.

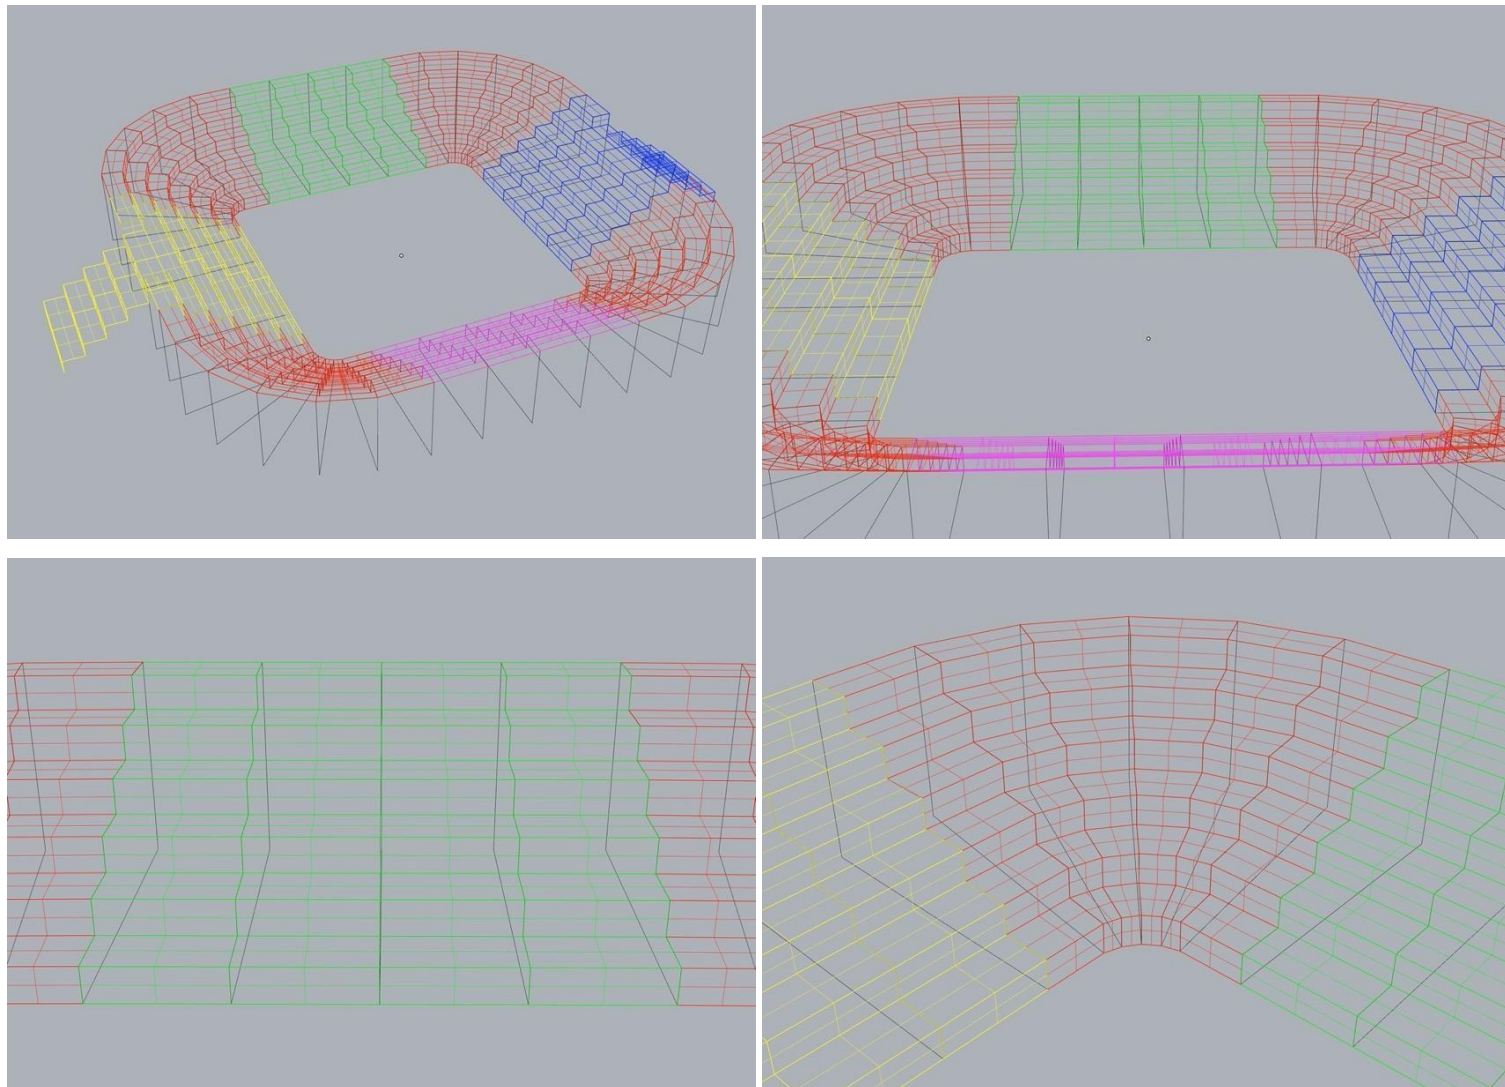

3. ARTS

Toda a instalação destes conjuntos, deverá ter as ARTs necessárias assinadas pelos engenheiros responsáveis de cada área. Deverá ser montada e supervisionada por profissionais especializados com experiência na instalação de arquibancadas, portando todos os documentos necessários de comprovação de atividade.

POIESIS

Rua Lubavitch, 64 – 01123-010 – Bom Retiro - São Paulo – SP
Tel/Fax: 11 3361 4976 | www.poiesis.org.br

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PALCO E PICADEIRO

1. GENERALIDADES

A presente especificação refere-se à fabricação e montagem de:

1. Palco modular 8mX8m por 1m de altura, que pode ser montado nos formatos 8mX8m ou em dois palcos 4mX4m.
2. Picadeiro com 6m de diâmetros por 70cm de altura.
3. Estrutura metálica treliçada de 10m de comprimento com 6m de altura para sustentação de cortinas e luz de espetáculo.

2. ESPECIFICAÇÕES.

Toda estrutura metálica do palco e do picadeiro deverá ser construída com metalon quadrado 80X80 com espessura 2,00mm. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica através do sistema MIG.

O piso do palco e picadeiro, deverá ser de chapas de compensado naval marítimo tratado de 30mm, com moldura metálica no formato U de 1mm para proteção das bordas da madeira, com travamento para evitar deslocamentos das chapas.

A treliça para cortinas e luz de espetáculo deve ser construída com metalon quadrado 40X40 com espessura de 2,00mm. Toda união dos metalões de aço deverá ser feita com soldagem eletrônica através do sistema MIG.

3. ARTS

Toda a instalação destes conjuntos, deverão ter as ARTs necessárias assinadas pelos engenheiros responsáveis de cada área. Deverá ser montada e supervisionada por profissionais especializados com experiência na instalação, portando todos os documentos necessários de comprovação de atividade.
